Travaux de renouvellement des canalisations d'eau potable

Rue des Sources, rue du Docteur d'Halluin, rue et impasse des Bleuets et rue de la Paix

A Lagny-sur-Marne

TEST Ingénierie

Présentation de l'opération

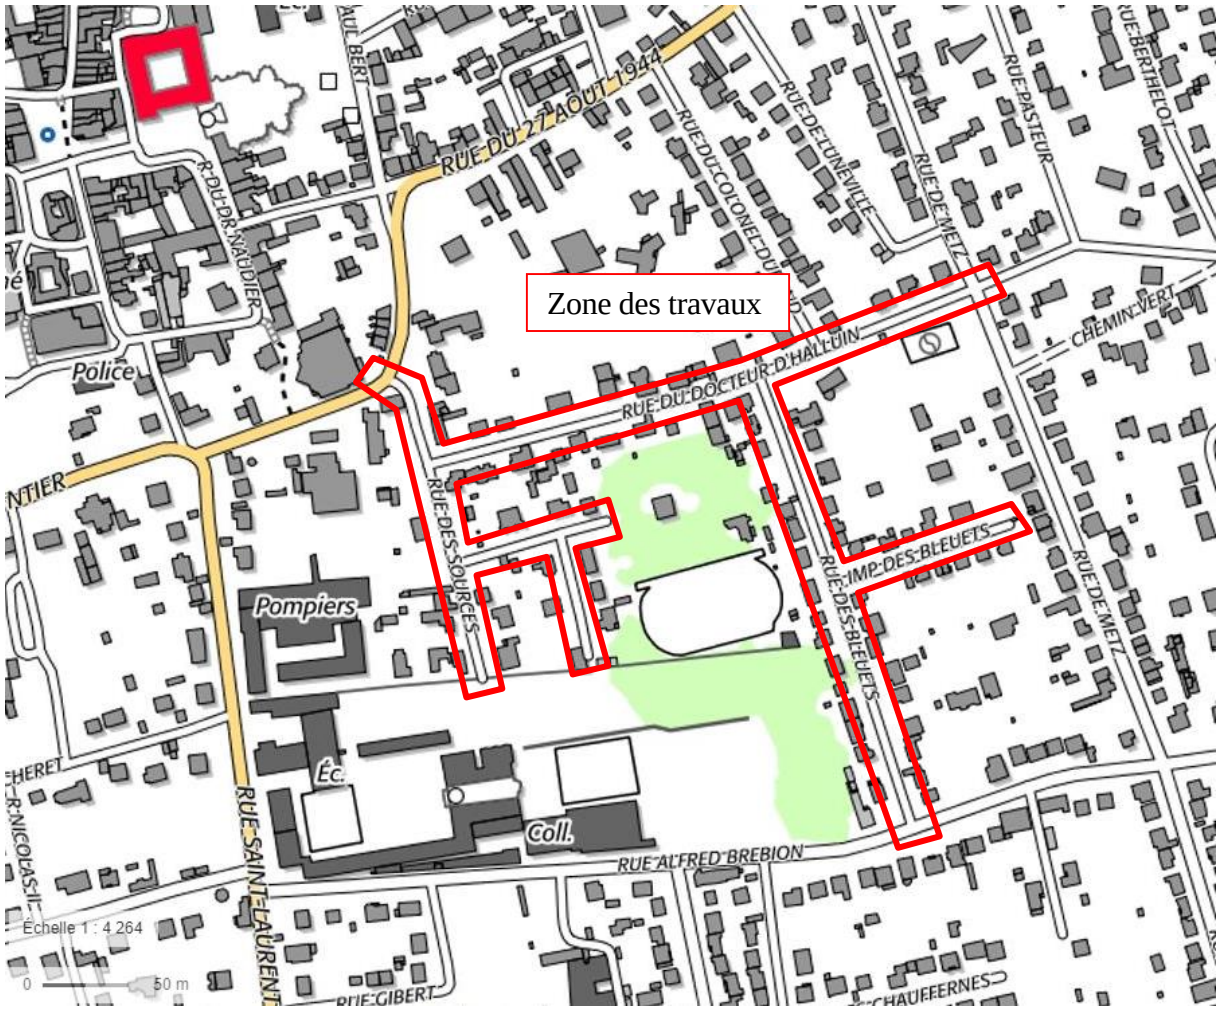

TEST Ingénierie

Présentation de l'opération

Objectif : Pérenniser et renforcer le réseau d'eau potable en remplaçant les canalisations vieillissantes.

Les travaux concernent :

- Rue des Sources et rue du Docteur d'Halluin : 417 ml de canalisations en PEHD 180 mm *(dont 60 ml sur la rue des Sources),*
- Rue des Sources : 124 ml de canalisations en PEHD 75 mm,
- Rue de la Paix : 140 ml de canalisations en PEHD 63 mm,
- Rue des Bleuets: 294 ml de canalisations en PEHD 125 mm,
- Impasse des Bleuets : 109 ml de canalisations en PEHD 63 mm,
- Report des branchements (92 branchements concernés),
- Renouvellement des branchements en PE noir (jusqu'au compteur),
- Renouvellement des branchements d'une cour commune rue du Docteur d'Halluin,
- Pose des 2 hydrants sur la rue du Docteur d'Halluin.

TEST Ingénierie

Phasage :

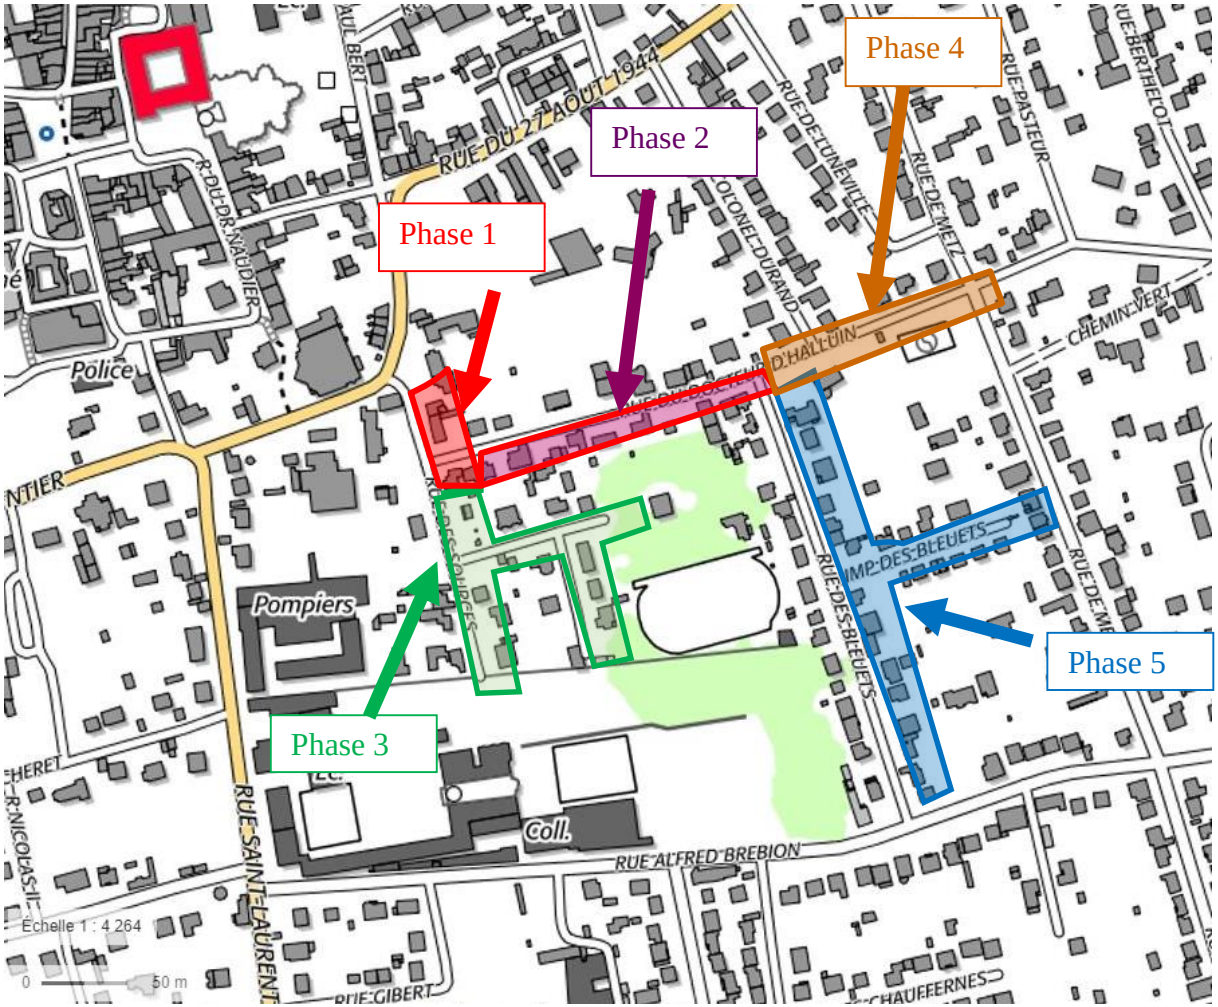

TEST Ingénierie

Phasage prévisionnel :

- **Durée période préparation : 1 mois**
- **Durée des travaux : 18 semaines**
- **Phase 1 : du 03/06/19 au 07/06/19 (*) et du 17/06/19 au 21/06/19**
- **Phase 2 : du 05/06/19 (*) au 14/06/19 et du 24/06/19 au 19/07/19**
- **Phase 3 : du 22/07/19 au 14/08/19**
- **Phase 4 : du 19/08/19 au 05/09/19**
- **Phase 5 : du 06/09/19 au 04/10/19**

(*) en fonction de l'état d'avancement

Les travaux seront réalisés par route barrée avec la mise en place des déviations avec accès riverains en-dehors des heures travaillées. Stationnement interdit.

Circulation:

Phase 1 :Travaux rue des Sources entre boulevard Gallieni et rue du Docteur d'Halluin

du 03/06/19 au 07/06/19 (*) et du 17/06/19 au 21/06/19

(*) en fonction de l'état d'avancement

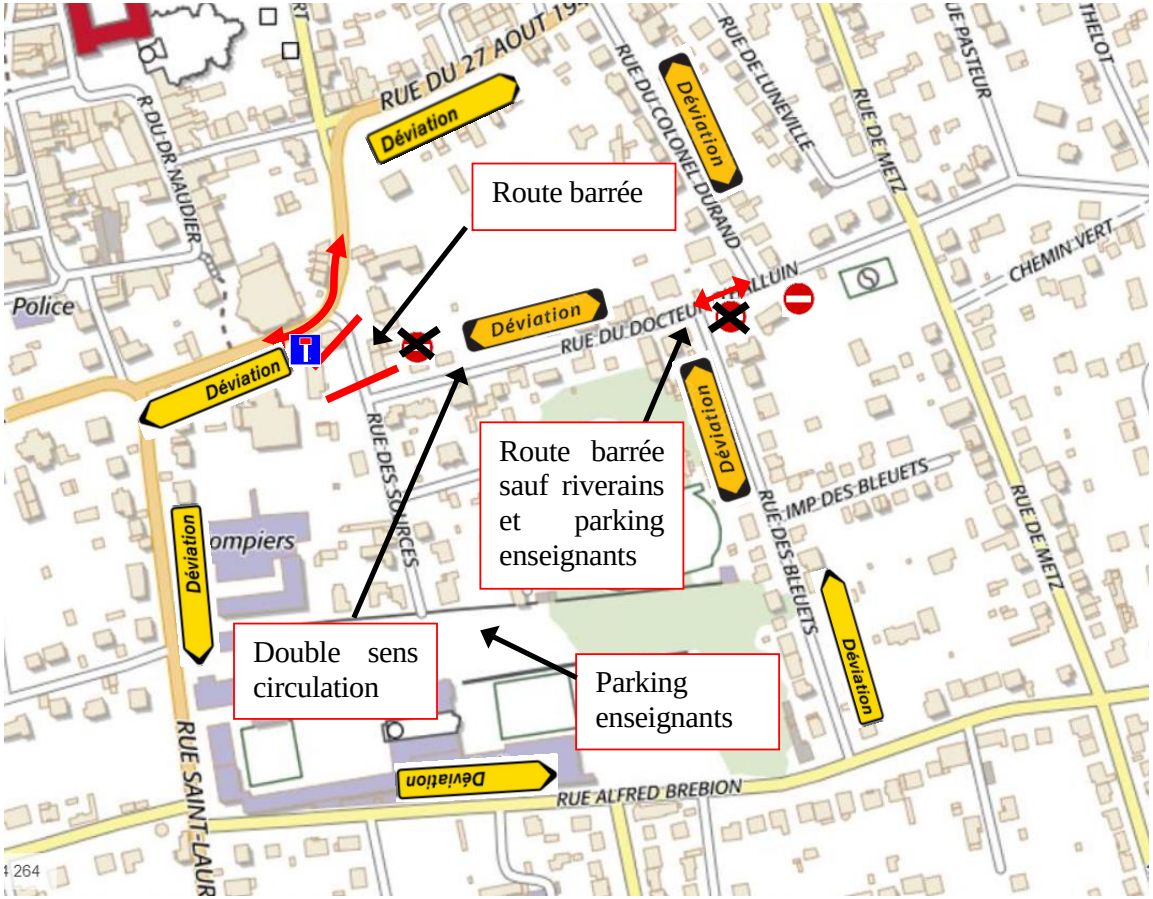

TEST Ingénierie

Circulation:

Phase 2 : Travaux rue du Docteur d'Halluin entre rue des Sources et rue des Bleuets

du 05/06/19 (*) au 14/06/19 et du 24/06/19 au 19/07/19

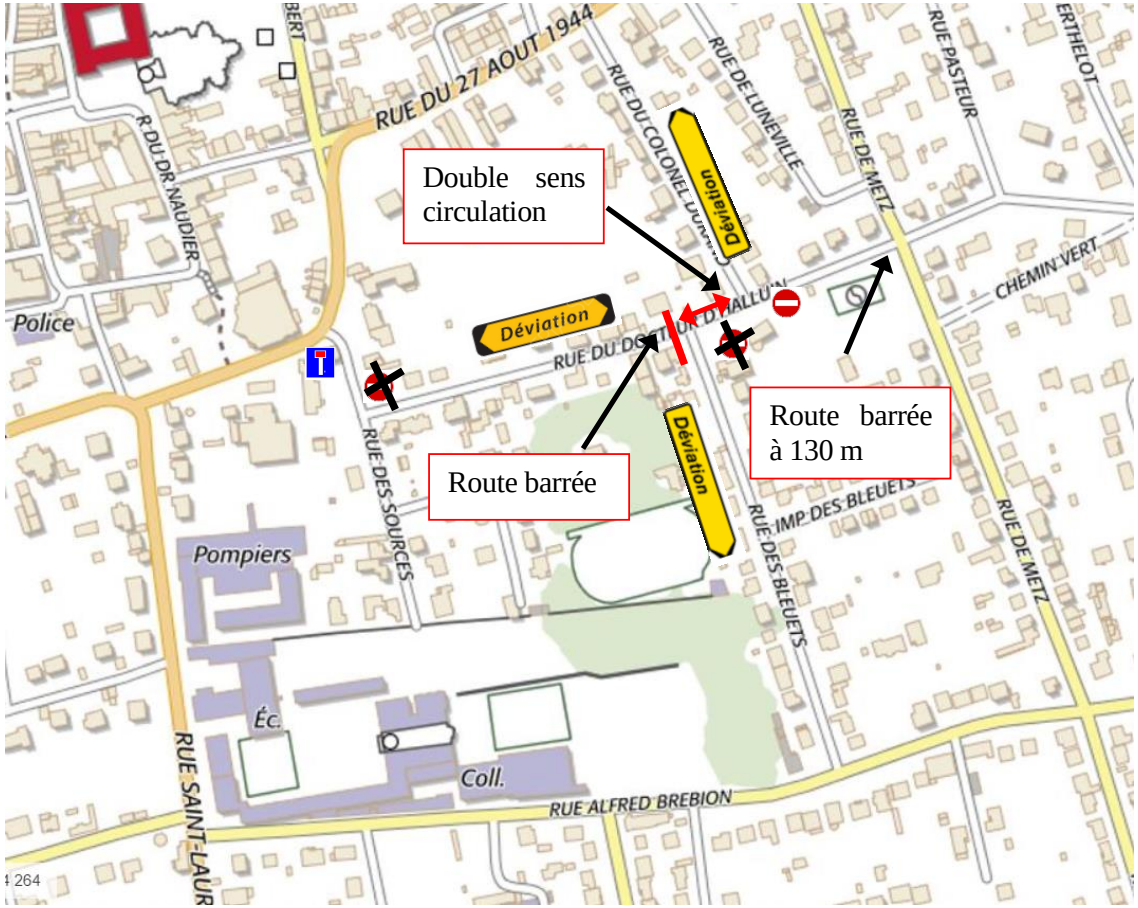

(*) en fonction de l'état d'avancement

TEST Ingénierie

Circulation:

Phase 3 : Travaux rue des Sources et rue de la Paix

du 22/07/19 au 14/08/19

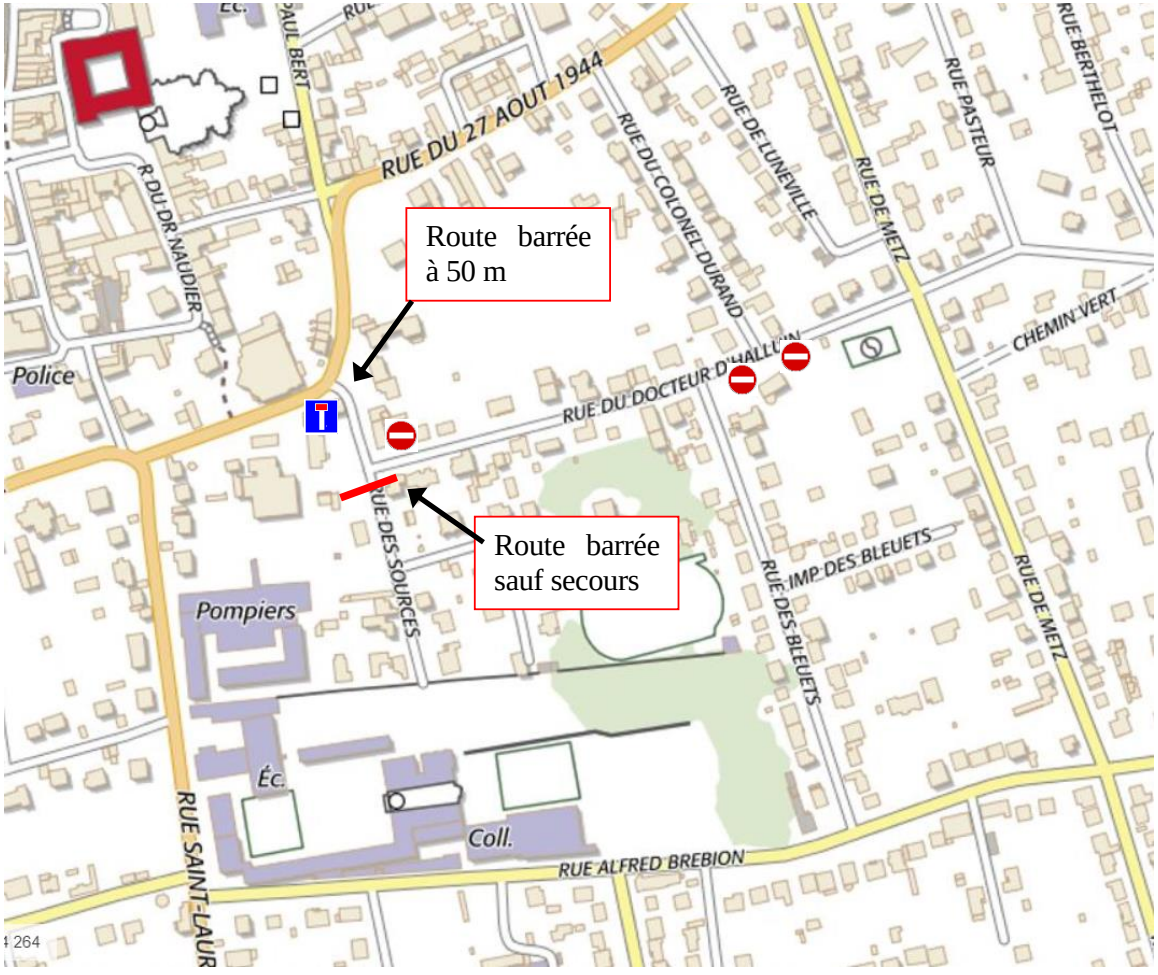

TEST Ingénierie

Circulation:

Phase 4 : Travaux rue du Docteur d'Halluin entre rue des Bleuets et rue de Metz

du 19/08/19 au 05/09/19

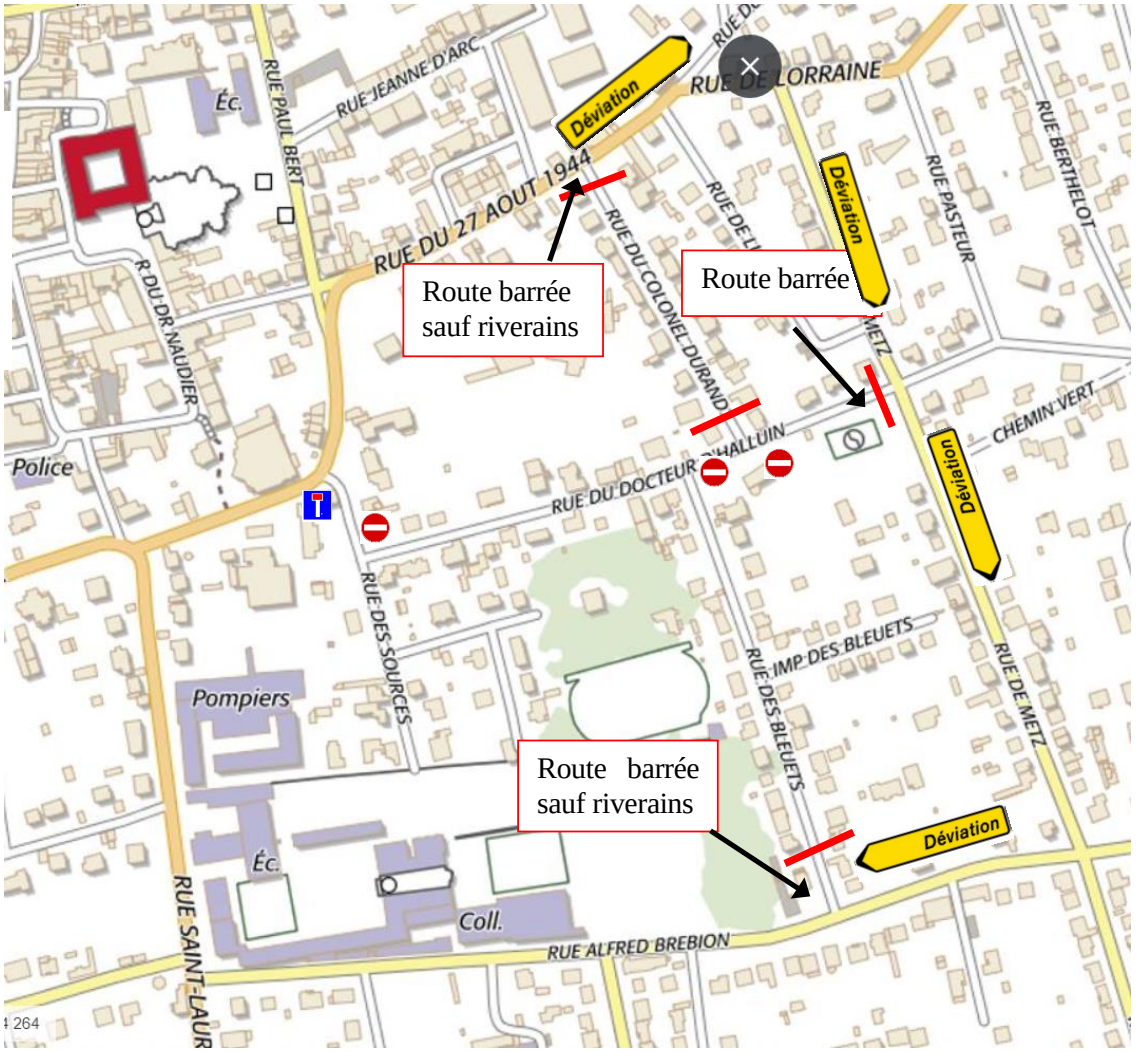

Circulation:

Phase 5 : Travaux rue des Bleuets et impasse des Bleuets

du 06/09/19 au 04/10/19

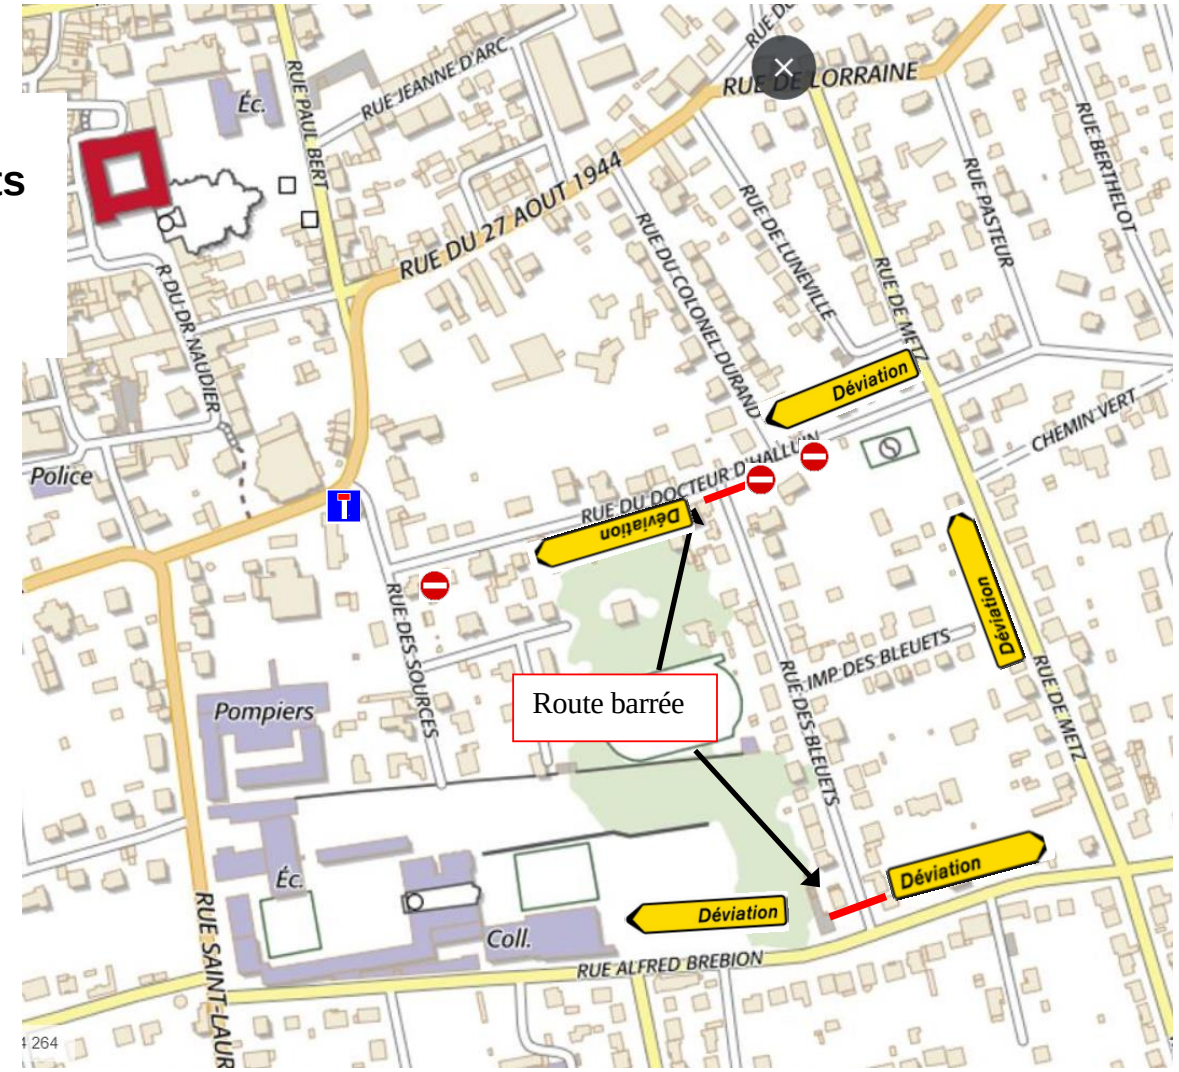

Impact pour les usagers – Accès riverains

- Durant la journée (entre 7h30 et 17h00) la route sera fermée à la circulation afin de pouvoir travailler en toute sécurité ;
- Les riverains (véhicules) pourront accéder chez eux, en dehors des horaires du chantier.
- Aucune voiture ne doit stationner dans la rue.
- Maintien permanent des accès piétons, des accès riverains et des véhicules de secours.
- Le chef de chantier se tiendra à la disposition des riverains afin de répondre aux questions et organiser, en concertation avec les personnes concernées, les accès pour les livraisons.

Collecte des ordures ménagères

- Ordures ménagères : les sortir la veille des jours de collecte
- Emballage et verre : les sortir la veille du jour de collecte
- Encombrants : les sortir la veille du jour de collecte
- Déchets verts : les sortir la veille du jour de collecte

Les camions de ramassage passeront le matin tôt avant l'ouverture du chantier (avant 7h30).

Pour la phase 2, le ramassage sera prévu sur deux points de collecte :

- A l'angle de la rue des Sources/rue du Docteur d'Halluin
- A l'angle de la rue du Docteur d'Halluin / rue des Bleuets
- Les conteneurs devront être déposés par les riverains au point de collecte le plus proche. L'entreprise se chargera de les ramener. Les conteneurs devront être numérotés.
